

# Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ Oktober 2024 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Pirhuvudet är finplaneringen nu klar

## Projektinformation

Under oktober månad fortsätter trällarbeten på långbryggan. Utmed bryggan klär vi in sidorna också med trällvirke. Vi har börjat montera utrustning i form av sittbänkar och omklädningsrum. Elinstallationer pågår också vid bryggan. Vid noden fortsätter vi med med finplaneringen här har vi nu lagt ut matjord och utfört grässådd samt plantering av buskar och träd. Utmed gångvägen har belysningsstolparna nu monterats. Vid pirhuvudet har smågatsten lagts runt konstverksfundamentet och stålräcket har monterats.

## Vad händer framöver


Under november månad jobbar vi vidare med träarbeten på långbryggan, montage av bänkar och omklädningsrum utförs. Vid långbryggan kommer vi också påbörja fundamentet för bryggans anslutning till piren. Utmed piren kommer det finplaneras och monteras bänkar och diverse utrustning. Utmed piren kommer stensjöllytor läggas och fundament för utrustning gjutas.

### Pågående byggdelar

- Piren finplanering
- Långbrygga montage av trallytor och utrustning
- Pirhuvudet finplanering
- Noden, finplanering och elarbeten

# Framnäs strandpark

## Långbryggan

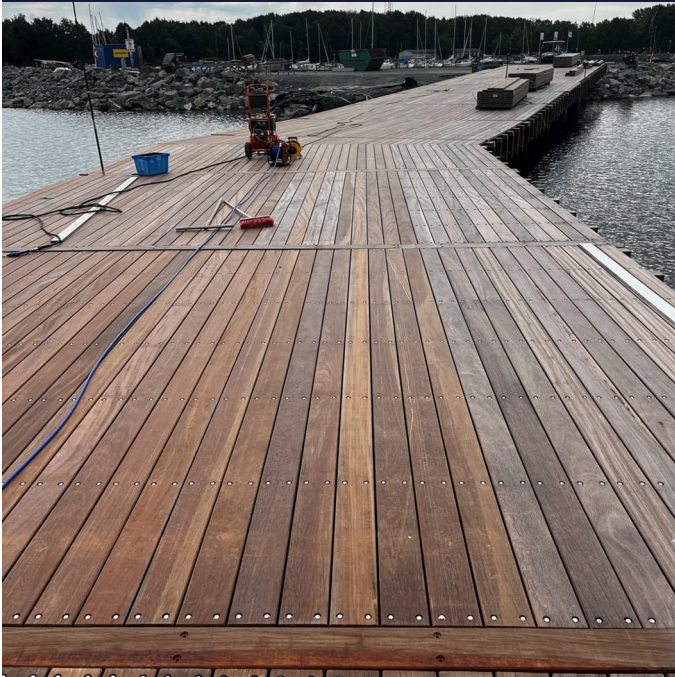

Långbryggan, trallarbetet pågår för fullt.

## Noden



Finplanering av gräsytor, plantering och montage av utrustning.
